



Ofício N° 1000/2025

Caxias (MA), 28 de outubro de 2025.

À Sua Senhoria o Senhor

OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO

SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 1ª **Medição** do **CONTRATO N° 001/2025 DA DISPENSA 05/2025**, firmado com a EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias)**, no valor de R\$ 154.185,52 (Cento e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e doze). Informamos que a Fonte é pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. (CIDE)

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

*Recebido em
28/10/2025*



ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2025 DA DISPENSA 05/2025

Caxias (MA), 24 de julho de 2025.

EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.175.218/0001-87

ENDEREÇO: Avenida A/Sambaquis, Quadra:16; Lote 02; Cep: 65071390, Calhau, São Luis – MA.

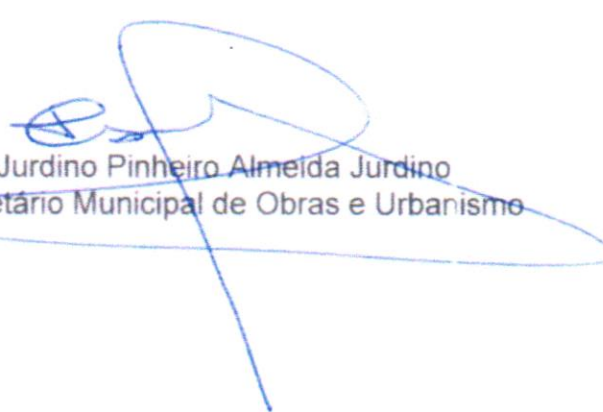
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias) nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais).

FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios (Gestão /Unidade: 27; Fonte de Recurso: 11; Programa de Trabalho: 26.782.0021.1091.0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações)

Conforme Contrato de Execução de Serviços para **Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias) nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**


Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



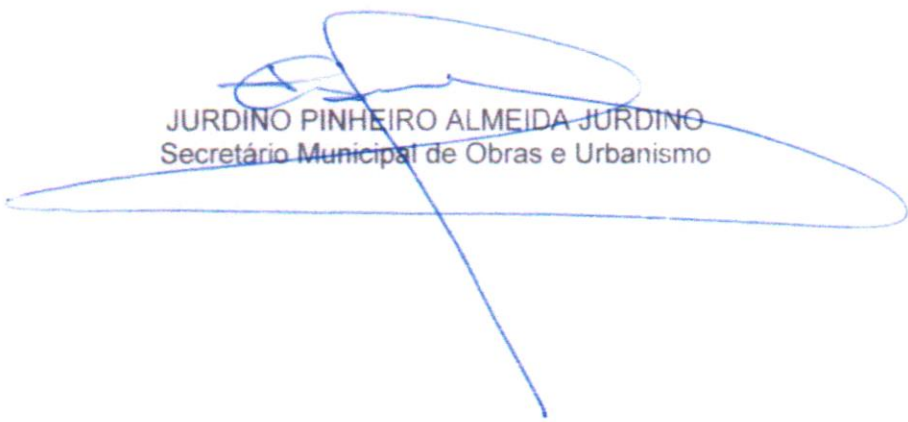
PORTARIA 110 DE 24 DE JULHO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA. no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar os Engenheiro Civil **SAMUEL COSTA DE SOUSA**, CREA-MA 1116025540, **HIGOR GARCIA DA SILVA**, CREA 1118102150, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscais das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001/2025 DA DISPENSA 05/2025**, firmado com a EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.175.218/0001-87, ENDEREÇO: Avenida A/Sambaquis, Quadra:16; Lote 02; Cep: 65071390, Calhau, São Luis – MA, cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias) nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**

DÊ CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



OFÍCIO 031/2025

22 DE OUTUBRO DE 2025

A ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 00.175.218/0001-87, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, CEP 65.070-100, por intermédio da representante legal Sra. HÉRIKA SILVA MENDONÇA, portadora do CPF 807.035.773-87, detentora do contrato de N° 001/2025 - DL 005/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Primeira Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 0001 Conta: 3072715-4

Instituição: 403 – Cora SCD

Nome da Empresa: Abreu Empreendimentos LTDA

CNPJ: 00.175.218/0001-87

Atenciosamente,

Hérika Silva Mendonça
CPF: 807.035.773-87
Proprietária
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

HÉRIKA SILVA MENDONÇA

CPF: 807.035.773-87



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 154.185,52

A ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 00.175.218/0001-87, sediada na Avenida Beta, Quadra 19, número 04, Loja 11, Sparta Center, Parque Atenas, São Luís, Maranhão, CEP 65.070-100, por intermédio da representante legal Sra. HÉRIKA SILVA MENDONÇA, portadora do CPF 807.035.773-87, solicita o pagamento, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, MARANHÃO**, do valor de **R\$ 154.185,52 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)**, conforme Nota Fiscal 00000036, referente à **medição 01** dos serviços (período de 24 de julho de 2025 a 20 de outubro de 2025) dos **SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA RUA MORRO VERDE, CAXIAS, MARANHÃO**, objeto do DL Nº 005/2025.

São Luís, 27 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

Hérika Silva Mendonça
CPF: 807.035.773-87
Proprietária
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

HÉRIKA SILVA MENDONÇA

CPF: 807.035.773-87



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000036

Data e Hora da Emissão

27/10/2025 18:27:17

Código de Verificação

7731.1DB0.CACE.4F86.45CF.A76F.E2ED.E684

CERTIFICADO
1820250092110368

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**CPF / CNPJ: **00.175.218/0001-87**Endereço: **AV A/SAMBAQUIS, QUADRA:16;LOTE:02; 02 LOTE 02 QUADRA16 - BAIRRO CALHAU - CEP: 65071390**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Inscrição Municipal: **30379004** Email: **atendimento@vrcontabilidade.** Telefone: **(98) 2321846**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**Endereço: **R PRAÇA DO PATEON, N° 600 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65606050**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Inscrição Municipal: Email: **fiscalizacao@caxias.ma.gov.br** Telefone: **(98) 32252626**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA. PERÍODO: 24 DE JULHO DE 2025 A 20 DE OUTUBRO DE 2025. CONTRATO 001/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 3072715-4 - INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

| Tipo do Item | Item | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|
| TRIBUTÁVEL | VALOR MATERIAIS | 1 | 61.674,21 | 61.674,21 |
| TRIBUTÁVEL | VALOR MÃO DE OBRA | 1 | 92.511,31 | 92.511,31 |

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 Data 28/10/2025
 Assinatura

Higor Garcia da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - MA: 1118102150

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154.185,52**

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total Composição: R\$ 0,00 | Valor Total Deduções: R\$ 61.674,21 | Base Cálculo: R\$ 92.511,31 | Aliquota: 5,00% | Valor ISS: R\$ 4.625,57 |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação: Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Mês de: 10/2025
 Local de Prestação do: CAXIAS / MA
 Recolhimento: RETIDO
 Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA



| | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------|
| CONTRATADA | ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA | | |
| CNPJ | 00.175.218/0001-87 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 005/2025 |
| DESCRIÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, CAXIAS, MARANHÃO. | | |
| CONTRATO | 001/2025 | DATA: | 22/10/2025 |
| CONTRATANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MARANHÃO | | |
| PERÍODO REF. | 24 DE JULHO DE 2025 A 20 DE OUTUBRO DE 2025 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL - 01 | | | ACUMULADO ATUAL | | | SALDO CONTRATUAL | | |
|----------|--|-------|--------|---------------|-----------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | R\$ 19.893,80 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 19.893,80 | | | R\$ 19.893,80 | | | R\$ 0,00 |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | R\$ 465,20 | R\$ 2.791,20 | | R\$ - | 0,00% | 6,00 | R\$ 2.791,20 | 0,80% | 6,00 | R\$ 2.791,20 | 0,80% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 1.2 | COMPOSIÇÃO BASE SBC 014032-MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS | UM | 1,00 | R\$ 10.500,00 | R\$ 10.500,00 | | R\$ - | 0,00% | 1,00 | R\$ 10.500,00 | 3,00% | 1,00 | R\$ 10.500,00 | 3,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 1.3 | BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 10,00 | R\$ 660,26 | R\$ 6.602,60 | | R\$ - | 0,00% | 10,00 | R\$ 6.602,60 | 1,89% | 10,00 | R\$ 6.602,60 | 1,89% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | R\$ 12.096,47 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 12.096,47 | | | R\$ 12.096,47 | | | R\$ 0,00 |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 120,00 | R\$ 13,16 | R\$ 1.579,57 | | R\$ - | 0,00% | 120,00 | R\$ 1.579,57 | 0,45% | 120,00 | R\$ 1.579,57 | 0,45% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 2.2 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ | M3 | 120,00 | R\$ 5,00 | R\$ 600,06 | | R\$ - | 0,00% | 120,00 | R\$ 600,06 | 0,17% | 120,00 | R\$ 600,06 | 0,17% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 600,00 | R\$ 2,56 | R\$ 1.533,01 | | R\$ - | 0,00% | 600,00 | R\$ 1.533,01 | 0,44% | 600,00 | R\$ 1.533,01 | 0,44% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 2.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 120,00 | R\$ 69,87 | R\$ 8.383,83 | | R\$ - | 0,00% | 120,00 | R\$ 8.383,83 | 2,40% | 120,00 | R\$ 8.383,83 | 2,40% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 3 | INFRAESTRUTURA | | | | R\$ 78.763,47 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 66.431,13 | | | R\$ 66.431,13 | | | R\$ 12.332,34 |
| 3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 120,00 | R\$ 107,23 | R\$ 12.868,05 | | R\$ - | 0,00% | 120,00 | R\$ 12.868,05 | 3,68% | 120,00 | R\$ 12.868,05 | 3,68% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 3.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 455,04 | R\$ 10,48 | R\$ 4.767,93 | | R\$ - | 0,00% | 300,00 | R\$ 3.143,42 | 0,90% | 300,00 | R\$ 3.143,42 | 0,90% | 155,04 | R\$ 1.624,52 | 0,46% |
| 3.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 414,62 | R\$ 10,25 | R\$ 4.251,86 | | R\$ - | 0,00% | 296,00 | R\$ 3.035,43 | 0,87% | 296,00 | R\$ 3.035,43 | 0,87% | 118,62 | R\$ 1.216,43 | 0,35% |
| 3.4 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação | M | 90,00 | R\$ 343,96 | R\$ 30.956,83 | | R\$ - | 0,00% | 90,00 | R\$ 30.956,83 | 8,84% | 90,00 | R\$ 30.956,83 | 8,84% | 0,00 | R\$ - | 0,00% |
| 3.5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 35,50 | R\$ 730,11 | R\$ 25.918,80 | | R\$ - | 0,00% | 22,50 | R\$ 16.427,41 | 4,69% | 22,50 | R\$ 16.427,41 | 4,69% | 13,00 | R\$ 9.491,39 | 2,71% |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | | | R\$ 162.135,63 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 22.988,04 | | | R\$ 22.988,04 | | | R\$ 139.147,59 |
| 4.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 948,50 | R\$ 10,48 | R\$ 9.938,43 | | R\$ - | 0,00% | 589,00 | R\$ 6.171,57 | 1,76% | 589,00 | R\$ 6.171,57 | 1,76% | 359,50 | R\$ 3.766,86 | 1,08% |
| 4.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 777,42 | R\$ 10,25 | R\$ 7.972,32 | | R\$ - | 0,00% | 450,00 | R\$ 4.614,68 | 1,32% | 450,00 | R\$ 4.614,68 | 1,32% | 327,42 | R\$ 3.357,64 | 0,96% |
| 4.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 520,02 | R\$ 9,03 | R\$ 4.693,32 | | R\$ - | 0,00% | 300,00 | R\$ 2.707,58 | 0,77% | 300,00 | R\$ 2.707,58 | 0,77% | 220,02 | R\$ 1.985,74 | 0,57% |
| 4.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 11,50 | R\$ 1.066,76 | R\$ 12.267,80 | | R\$ - | 0,00% | 8,90 | R\$ 9.494,21 | 2,71% | 8,90 | R\$ 9.494,21 | 2,71% | 2,60 | R\$ 2.773,59 | 0,79% |

Handwritten signature or mark in blue ink.



CONTRATADA ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025
 CNPJ 00.175.218/0001-87
 DESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, CAXIAS, MARANHÃO.
 CONTRATO 001/2025 DATA: 22/10/2025
 CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MARANHÃO
 PERÍODO REF. 24 DE JULHO DE 2025 A 20 DE OUTUBRO DE 2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL - 01 | | | ACUMULADO ATUAL | | | SALDO CONTRATUAL | | |
|------|---|------|--------|--------------------|----------------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|------------|-----------------|------------|---|------------------|-------|---|
| | | | | | | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | % |
| 4.5 | PERFIL METÁLICO 1"; PRÉ-PINTADO C/H=500mm | M | 36,00 | R\$ 1.621,64 | R\$ 58.379,06 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 58.379,06 | 16,68% | | | | |
| 4.6 | Aparelho de apoio de neoprene freiado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | DM3 | 7,00 | R\$ 136,62 | R\$ 956,33 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 956,33 | 0,27% | | | | |
| 4.7 | Perfil "U" de aço laminado, "U" 152 x 15,6 | M | 48,00 | R\$ 178,40 | R\$ 8.563,10 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 8.563,10 | 2,45% | | | | |
| 4.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 21,00 | R\$ 580,15 | R\$ 12.183,05 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 12.183,05 | 3,48% | | | | |
| 4.9 | COMPOSIÇÃO SBC 0404699-LAJE PRE-FABRIC STEEL DECK 75 15CM C.U.TX.B.30MPA+TELAQ283 | M2 | 85,00 | R\$ 555,09 | R\$ 47.182,23 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 47.182,23 | 13,48% | | | | |
| 5 | SERVIÇOS FINAIS | | | | R\$ 2.709,18 | R\$ 0,00 | | | R\$ 0,00 | | | R\$ 2.709,18 | | | | | |
| 5.1 | PINTURA COM TINTA AGRÍCOLA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 | M2 | 52,80 | R\$ 30,33 | R\$ 1.601,46 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.601,46 | 0,46% | | | | |
| 5.2 | LIMPEZA GERAL | M2 | 85,00 | R\$ 13,03 | R\$ 1.107,72 | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ - | 0,00% | 0,00% | R\$ 1.107,72 | 0,32% | | | | |
| | | | | VALOR DO ORÇAMENTO | R\$ 275.596,55 | R\$ | | | R\$ 121.409,44 | R\$ | 121.409,44 | R\$ | 154.189,11 | | | | |
| | | | | VALOR DO BDI | R\$ 74.401,45 | R\$ | | | R\$ 32.776,07 | R\$ | 32.776,07 | R\$ | 41.625,58 | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 350.000,00 | R\$ | | | R\$ 154.185,52 | R\$ | 154.185,52 | R\$ | 195.814,49 | | | | |

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
 HÉRIKA SILVA MENDONÇA
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 891.173.87
 PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MA: 1113326271-D

Hérika Silva Mendonça
 CPF: 891.173.87
 PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MA: 1113326271-D



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250973445

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1113326271
Registro: 1113326271MA

Empresa contratada: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0005470510-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

PRAÇA DIAS CARNEIRO

Nº: 600

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65606050**

Contrato: **001/2025**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 350.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MORRO VERDE

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **SERIEMA**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65602580**

Data de Início: **24/07/2025**

Previsão de término: **23/07/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.845231, -43.360117**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

47,00

m³

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

85,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE (VILA ARIAS), CAXIAS, MARANHÃO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

RNP: 1113326271

Data: 09/10/2025 17:24:07

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER - CPF: *.978.163-**-**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA DE CAXIAS - CNPJ:
06.082.820/0001-56**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **08/10/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **8306579254**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publ/co/>, com a chave: y9Z9b
Impresso em: 09/10/2025 às 17:24:07 por: , ip: 191.178.174.189

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 001/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025

SEGUE O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 01ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, EM CAXIAS, MARANHÃO.



Higor Gabriel da Silva
Engenheiro Civil
CREA - MA 118102150

Armação de Base



Forma de Alas e Contenção



Forma de Alas e Contenção

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1118102150



Formas e Concretagem de Alas e Contenção



Armação de Base

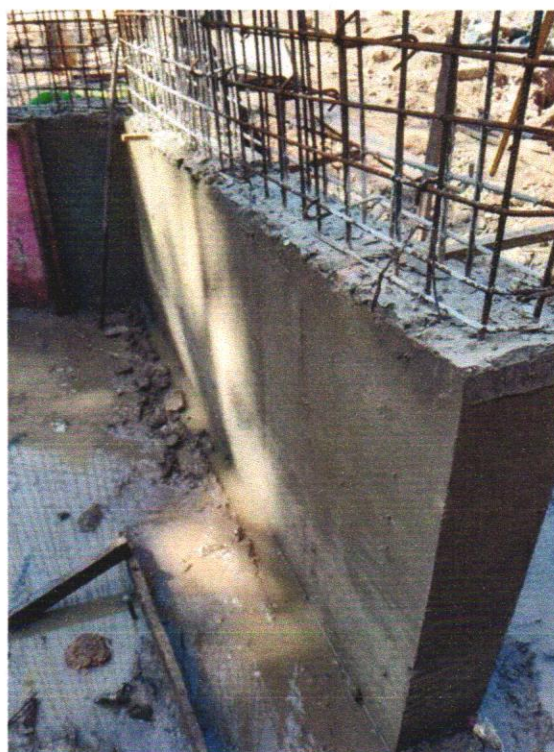


Armação de Base e Ancoramento

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 1146 27170



Concretagem de Ancoramento de Estrutura



Alas Concretadas

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA/MA: 1116702150



Contenção e Alas Concretadas



Desforma de Estruturas Inferiores

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA - MA: 1118102150



Estruturas Inferiores Concretadas para Seguimento da Super

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA - MA: 1118102150



Desforma das Infraestruturas



Detalhe da Aarmação das Alas e Base



Detalhe da Armação de Pilares e Bases

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA - MA/1118102150

Hérica Silva Mendonça
CPF: 807.023.773-87
Proprietária
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250973445

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1113326271

Registro: 1113326271MA

Empresa contratada: **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : 0005470510-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

PRAÇA DIAS CARNEIRO

Nº: 600

Complemento

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65606050**

Contrato: 001/2025

Celebrado em:

Valor: **R\$ 350.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MORRO VERDE

Nº: **SN**

Complemento

Bairro: **SERIEMA**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65602580**

Data de Início: **24/07/2025**

Previsão de término: **23/07/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.845231, -43.360117**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

47,00

m²

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

85,00

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE (VILA ARIAS), CAXIAS - MARANHÃO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

RNP: 1113326271

Data: 09/10/2025 17:24:07

_____ de _____ de _____
Local data

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER - CPF: *.978.163-1****

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA DE CAXIAS - CNPJ:
06.082.820/0001-56**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **08/10/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **8306579254**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico> com a chave: y9Z9b
Impresso em 09/10/2025 às 17:24:07 por: ip.191.178.174.189

www.creama.org.br

atendimento@creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8303





Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 154.185,52 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**, conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 00000036 apresentada pela empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ **00.175.218/0001-87**, referente à **1ª MEDIÇÃO do CONTRATO Nº 001/2025 DA DISPENSA 05/2025** cujo objeto: da contratação de empresa especializada para reconstrução de uma ponte na rua morro verde (Vila Arias), informamos que a fonte recuso próprio, Caxias - MA.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Higor Garcia da Silva
Engenheiro Civil
CREA - MA - 1118102150

Caxias/MA, 28 de OUTUBRO de 2025.
