



Ofício N° 145/2025

Caxias (MA), 20 de Fevereiro de 2025.


À Sua Senhoria o Senhor
ADENILSON DIAS DE SOUSA
SEC. MUNICIPAL DE. EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
NESTA


Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 2ª **Medição** do **CONTRATO N° 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2023**, firmado com a **EMPRESA: ACCOR EMPREENDDIMENTOS LTDA**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajuí, Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma**, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no Edital e seus anexos, no valor de R\$ 85.161,98 (Oitenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos). Informamos que a Fonte de Recurso é do FUNDEB.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Pref. Mun. de Caxias - MA
Sec. Municipal de Educação
Recebido em 21/02/25


ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023

Caxias (MA), 29 de abril de 2024.

EMPRESA: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510732/0001-52

ENDEREÇO: Rua Luís Domingues, s/n, Bairro Centro, Barra do Corda - Ma

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajuí, Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no edital e seus anexos.


PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (Doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.477.658,66 (Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

FONTE DE RECURSOS: PRECATÓRIO DO FUNDEF

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de **Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajuí, Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no edital e seus anexos**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.



Vidigal Borges Torres
Secretário Municipal de Infraestrutura

PORTARIA 023 DE 29 DE ABRIL DE 2024.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**, CREA 1915421101, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023**, firmado com a **EMPRESA ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 25.510732/0001-52, ENDEREÇO: Rua Luís Domingues, s/n, Bairro Centro, Barra do Corda – Ma, cujo OBJETO é a **Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajui, Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no edital e seus anexos.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.



Vidigal Borges Torres
Secretário de Infraestrutura



Ao
Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretario municipal de
infraestrutura
MUNICÍPIO DE CAXIAS / MA


Assunto: SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço na Rua Luís Domingues, S/N, Centro, Barra do Corda /MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.510.732/0001-52, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **TASSIA LIANE ALVES NUNES**, portadora do RG nº 110952099-6 SSP/MA, CPF sob nº 962.317.423-34, vem pela presente solicitar o pagamento da 5ª (quinta) medição dos **SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, LOCALIZADA NA RUA CAJUI, BAIRRO LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00887/2023.**

Conforme planilha em anexo.

Barra do Corda, 11 de Fevereiro de 2025



ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
TASSIA LIANE ALVES NUNES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 962.317.423-34

Ao
Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretaria Municipal de Infraestrutura
MUNICÍPIO DE CAXIAS / MA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço na Rua Luís Domingues, S/N, Centro, Barra do Corda /MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.510.732/0001-52, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **TASSIA LIANE ALVES NUNES**, portadora do RG nº 110952099-6 SSP/MA, CPF sob nº 962.317.423-34, vem pela presente solicitar o pagamento da 2ª (segunda) medição dos **SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, LOCALIZADA NA RUA DO CAJUI, LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00887/2023.**

DADOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA:

NFSE. Nº. 202500000000003

Valor: R\$ 85.161,98 (Oitenta e Cinco Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Ref.: **2ª Medição.**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0782-X

CONTA: 36299-9

TITULAR: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510.732/0001-52.


Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e distinta consideração.

Barra do Corda - MA, 17 de fevereiro de 2025.

ACCOR
EMPREENDIMENTOS
LTDA:255107320001-
52

Assinado de forma digital por
ACCOR EMPREENDIMENTOS
LTDA:25510732000152
Dados: 2025.02.17 12:18:01
-03'00'

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.510.732/0001-52
Tassia Liane Alves Nunes
CPF: 962.317.423-34 –Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
20250000000003
 Data e Hora de Emissão
17/2/2025 10:36:50
 Código de Verificação
UI6879QG68

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **25.510.732/0001-52**
 Nome/Razão Social: **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Endereço: **RUA LUIS DOMINGUES, SN, , CENTRO, 65950000**
 Município: **BARRA DO CORDA**
 Email: **naoinformado@naoinformado.com.br**

Inscrição Municipal: **5136**
 UF: **MA**
 Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS / MA**
 Endereço: **PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600, , CENTRO, 65604090**
 Município: **CAXIAS**
 Email:

Inscrição Municipal: **0**
 Inscrição Estadual: **0**
 UF: **MA**
 Fone:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, LOCALIZADA NA RUA DO CAJUI, LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00887/2023.

DADOS: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0782-X

CONTA: 36299-9

TITULAR: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510.732/0001-52

VALOR UNIT.: R\$ 85.161,98

QTDE.: 1

VALOR TOTAL: R\$ 85.161,98

TOTAL GERAL: R\$ 85.161,98

ATESTO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS

Data 20/02/2025

Assinatura

Paulo Renato Carneiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101

Serviço:

702

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
85.161,98	0,00	0,00	85.161,98	2,0000	1.703,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85.161,98


RETENÇÕES

INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
34.064,79	0,00	34.064,79	51.097,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: FORA DO MUNICÍPIO (ISSQN DEVE SER RECOLHIDO NO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO)
 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE : CAXIAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS Secretaria Municipal de Infraestrutura		TIPO DE OBRA		Nº DA MEDIÇÃO		PLANILHA DE MEDIÇÃO					
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (OBSERVAÇÕES):		Nº OBRA/ LOCAL EMPRESA EXECUTORA		DATA DA VISTORIA % DA MEDIÇÃO		DATA DA VISTORIA % DA MEDIÇÃO					
A OBRA CONSTA COMO 4,34% CONCLUÍDA. FICA AUTORIZADA O PAGAMENTO DESTA 2ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 85.161,98		CT Nº 001 da Concorrência Pública nº 008/2023 (Proc. Adm. 00887/2023)/ Rua do Cajui, Luiza Queiroz, Caxias		PERÍODO DE EXECUÇÃO DADOS DA OBRA		PERÍODO DE EXECUÇÃO DADOS DA OBRA					
		ACCOR EMPREENDIMENTOS VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA TOTAL OBRA		10/09/2024 a 07/02/2025 R\$ 1.477.543,68 R\$ 1.477.543,68		10/09/2024 a 07/02/2025 R\$ 1.477.543,68 R\$ 1.477.543,68					
SERVIÇOS LICITADOS		Contratado		Acumulado Anterior		Medição Atual		Acumulado Total			
Item	Descrição	Und	Quant.	P.Unit.	Total	Quant.	Valor	%	Quant.	Valor	%
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL, INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				R\$ 10.206,55		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 10.206,55		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
2.1.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	22,63	451,02	R\$ 10.206,55		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
3	ESQUADRIAS				R\$ 331.896,90		R\$ 25.172,20	7,58%		R\$ 9.761,00	2,94%
3.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 49.466,84		R\$ 15.870,74	31,68%		R\$ 15.870,74	31,68%
3.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	10	805,29	R\$ 8.052,90	3,00	R\$ 2.415,87	30,00%	3,00	R\$ 2.415,87	30,00%
3.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	5	1458,91	R\$ 7.294,55	3,00	R\$ 4.376,73	60,00%	3,00	R\$ 4.376,73	60,00%
3.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	4	986,46	R\$ 3.945,84	2,00	R\$ 1.972,92	50,00%	2,00	R\$ 1.972,92	50,00%
3.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	6	986,46	R\$ 5.918,76	4,00	R\$ 3.945,84	66,67%	4,00	R\$ 3.945,84	66,67%
3.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	10	986,46	R\$ 9.864,60	3,00	R\$ 2.959,38	30,00%	3,00	R\$ 2.959,38	30,00%
3.1.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	16	772,82	R\$ 12.365,12	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
3.1.7	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	11,2	180,81	R\$ 2.025,07	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
3.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$ 90.716,37		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%
3.3.1	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,72	672,07	R\$ 4.516,32	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
3.3.2	Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	113,4	650,17	R\$ 73.729,28	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
3.3.3	Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,04	650,17	R\$ 3.276,86	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%

3.3.4	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	4,44	672,07	R\$	2.983,99	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.3.5	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	5,25	672,07	R\$	3.528,37	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.3.6	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,31	672,07	R\$	1.552,48	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.3.8	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,68	672,07	R\$	1.129,08	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4	PORTAS DE VIDRO - PV				R\$	1.814,94			0,00%			0,00%
3.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1	695,38	R\$	695,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4.2	Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1	695,38	R\$	695,38	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35	M2	0,61	695,38	R\$	424,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				R\$	88.945,32			0,00%			0,00%
3.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,75	649,03	R\$	1.135,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	1,6	649,03	R\$	1.038,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M2	3,22	713,39	R\$	2.297,12	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	M2	2,03	667,93	R\$	1.355,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	M2	2,1	667,93	R\$	1.402,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,1	667,93	R\$	1.402,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,6	667,93	R\$	8.415,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,3	667,93	R\$	4.207,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	18,9	667,93	R\$	12.623,88	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	2,1	667,93	R\$	1.402,65	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	6,3	667,93	R\$	4.207,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	8,4	667,93	R\$	5.610,61	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	12,6	667,93	R\$	8.415,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.14	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	33,6	667,93	R\$	22.442,45	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.15	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M2	16,8	667,93	R\$	11.221,22	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.5.16	Tela de nylon de proteção fixada na esquadria	m²	20,25	87,12	R\$	1.764,18	-	-	0,00%	-	-	0,00%

7.1.9	Pintura epoxi - 02 demãos	M2	172,17	47,42	RS	8.164,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
8	CAIXA DAGUA - 30.000L				RS	3.952,45																	0,00%
8.1	JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO	m²	39,72	30,87	RS	1.226,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
8.2	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO), AF_01/2020_P	m²	2,86	27,19	RS	77,76	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
8.3	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOIS), AF_01/2020_P	m²	39,72	47,42	RS	1.883,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
8.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	39,72	19,26	RS	765,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				RS	6.608,46																	67,74%
9.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				RS	2.176,50																	100,00%
9.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	12	18,02	RS	216,24	12,00	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	36	4,77	RS	171,72	20,00	98,40	98,40	98,40	171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	171,72	55,56%	-	-	-	44,44%	
9.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	6	9,51	RS	57,06	6,00	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	57,06	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.1.4	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	6	25,81	RS	154,86	6,00	154,86	154,86	154,86	154,86	154,86	154,86	154,86	154,86	154,86	154,86	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.1.5	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	6	42,05	RS	252,30	6,00	252,30	252,30	252,30	252,30	252,30	252,30	252,30	252,30	252,30	252,30	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.1.6	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	M	9	57,90	RS	521,10	9,00	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	521,10	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.1.7	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	M	6	101,63	RS	609,78	6,00	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	609,78	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	12	16,12	RS	193,44	12	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	193,44	100,00%	-	-	-	0,00%	
9.2	REGISTROS				RS	4.431,96																	51,90%
9.2.1	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1	67,79	RS	67,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
9.2.2	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1	22,95	RS	22,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
9.2.3	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UN	1	93,95	RS	93,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	100,00%	
9.2.4	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	5	136,50	RS	682,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	100,00%	
9.2.5	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	31	77,15	RS	2.391,65	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	48,39%	
9.2.6	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	16	73,32	RS	1.173,12	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	31,25%	
11	LOUÇAS E METAIS				RS	75.216,62																	0,00%
11.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	UN	2	1038,16	RS	2.076,32	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	UN	4	658,08	RS	2.632,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.3	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	UN	20	652,06	RS	13.041,20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.4	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	UN	26	347,45	RS	9.033,70	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.6	Assento Políester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2	610,76	RS	1.221,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.7	Assento plastico Izy, código AP.01, DECA	und	4	52,22	RS	208,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.8	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	26	164,04	RS	4.265,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
11.9	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4	291,33	RS	1.165,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	

11.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4	409,50	R\$	1.638,00	-	6,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.11	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	UN	6	153,56	R\$	921,36	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.12	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	UN	22	150,40	R\$	3.308,80	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.13	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	3	556,14	R\$	1.668,42	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.14	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	15	556,14	R\$	8.342,10	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.15	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26	144,73	R\$	3.762,98	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.16	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	22	51,23	R\$	1.127,06	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.17	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	un	8	111,46	R\$	891,68	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.18	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4	181,59	R\$	726,36	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.19	Barra de apoio para chuveiro PNE, em "L"	un	1	702,83	R\$	702,83	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.20	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	M	20,6	104,07	R\$	2.143,64	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.21	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigoito ou equivalente	un	4	321,87	R\$	1.287,48	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.22	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2	144,00	R\$	288,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.23	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	un	4	144,00	R\$	576,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.24	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	UN	15	69,53	R\$	1.042,95	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.25	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UN	15	137,20	R\$	2.058,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.26	Torneira de parede de uso geral para jardim ou lanque	UN	11	21,51	R\$	236,61	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.31	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	UN	32	79,01	R\$	2.528,32	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.32	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	15	113,12	R\$	1.696,80	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11.33	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UN	7	946,39	R\$	6.624,73	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL				R\$	3.399,56		24,74%	R\$	841,14		0,00%	R\$	841,14
12.1	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	M/2	0,16	754,17	R\$	120,67	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12.2	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	m	3	6,58	R\$	19,74	3,00	100,00%	19,74	0,00%	3,00	100,00%	19,74	100,00%
12.3	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	UN	4	50,22	R\$	200,88	4,00	100,00%	200,88	0,00%	4,00	100,00%	200,88	100,00%
12.4	União 3/4" NPT 300	UN	3	69,83	R\$	209,49	3,00	100,00%	209,49	0,00%	3,00	100,00%	209,49	100,00%
12.5	Niple 3/4" NPT 300	UN	6	21,92	R\$	131,52	6,00	100,00%	131,52	0,00%	6,00	100,00%	131,52	100,00%
12.6	Niple 1/2" NPT 300	UN	4	13,99	R\$	55,96	4,00	100,00%	55,96	0,00%	4,00	100,00%	55,96	100,00%
12.7	Niple 1/4" NPT 300	un	4	17,16	R\$	68,64	4,00	100,00%	68,64	0,00%	4,00	100,00%	68,64	100,00%
12.8	Té redução 3/4"x1/2"	UN	1	30,77	R\$	30,77	1,00	100,00%	30,77	0,00%	1,00	100,00%	30,77	100,00%
12.9	Redução 1/2" x 1/4"	un	1	14,08	R\$	14,08	1	100,00%	14,08	0,00%	1,00	100,00%	14,08	100,00%
12.10	Luva de redução 3/4 x 1/2"	UN	2	26,67	R\$	53,34	2,00	100,00%	53,34	0,00%	2,00	100,00%	53,34	100,00%

12.11	Luva de redução 1/2" x 1/4"	un	2	14,08	R\$	28,16	2,00	28,16	100,00%	-	0,00%	2,00	28,16	100,00%
12.12	Joelho 1/2" NPT 300	un	2	14,28	R\$	28,56	2,00	28,56	100,00%	-	0,00%	2,00	28,56	100,00%
12.13	Regulador 1º estágio com manômetro	un	1	721,10	R\$	721,10	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
12.14	Manômetro NPT 1/4" - 0 a 300 psi	un	1	191,39	R\$	191,39	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
12.15	Maneira Flexível	un	2	56,00	R\$	112,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
12.16	Regulador 2º estágio com registro	un	2	679,69	R\$	1.359,38	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
12.17	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1	26,94	R\$	26,94	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
12.18	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1	26,94	R\$	26,94	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$	47.015,56		R\$	8.841,48	18,81%		R\$	8.841,48	18,81%
13.1	Extintor ABC - 6KG	UN	7	226,65	R\$	1.586,55	0	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	1	676,65	R\$	676,65	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.3	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	UN	2	134,21	R\$	268,42	2,00	268,42	100,00%	-	0,00%	2,00	268,42	100,00%
13.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7	123,17	R\$	862,19	7,00	862,19	100,00%	-	0,00%	7,00	862,19	100,00%
13.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25	193,37	R\$	241,71	1,25	241,71	100,00%	-	0,00%	1,25	241,71	100,00%
13.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	10	75,42	R\$	754,20	10,00	754,20	100,00%	-	0,00%	10,00	754,20	100,00%
13.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	M	4	204,10	R\$	816,40	4,00	816,40	100,00%	-	0,00%	4,00	816,40	100,00%
13.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 2 1/2"	UN	65,27	104,70	R\$	6.833,77	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.9	Adaptador storz - rosca internas 2 1/2"	un	3	315,21	R\$	945,63	3,00	945,63	100,00%	-	0,00%	3,00	945,63	100,00%
13.10	Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm	un	3	285,45	R\$	856,35	3,00	856,35	100,00%	-	0,00%	3,00	856,35	100,00%
13.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UN	3	20,95	R\$	62,85	3,00	62,85	100,00%	-	0,00%	3,00	62,85	100,00%
13.12	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3	406,59	R\$	1.219,77	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.13	Mangueiras 1 1/2" 16mm	UN	6	555,16	R\$	3.330,96	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UN	3	80,28	R\$	240,84	3,00	240,84	100,00%	-	0,00%	3,00	240,84	100,00%
13.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2"	un	3	265,24	R\$	795,72	3,00	795,72	100,00%	-	0,00%	3,00	795,72	100,00%
13.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3	321,59	R\$	964,77	3,00	964,77	100,00%	-	0,00%	3,00	964,77	100,00%
13.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UN	3	85,90	R\$	257,70	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.18	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	UN	5	236,78	R\$	1.183,90	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.19	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	2	447,30	R\$	894,60	2,00	894,60	100,00%	-	0,00%	2,00	894,60	100,00%
13.20	União de ferro conico macho-femea 2 1/2"	UN	4	284,45	R\$	1.137,80	4,00	1.137,80	100,00%	-	0,00%	4,00	1.137,80	100,00%
13.21	Luminária de emergência com lampada fluorecente 9W de 1 hora	UN	40	259,86	R\$	10.394,40	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.22	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	M2	8	11,64	R\$	93,12	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	3	11,64	R\$	34,92	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.24	Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV	Un	2	6075,76	R\$	12.151,52	0	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.25	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incêndio	un	2	16,35	R\$	32,70	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.26	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saida de emergência	un	15	13,74	R\$	206,10	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.27	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida"	un	3	13,74	R\$	41,22	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
13.28	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	8	16,35	R\$	130,80	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				R\$	181.381,77		R\$	5.284,99	2,91%		R\$	14.262,44	7,86%
14.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$	3.165,08			0,00%					0,00%
14.1.1	Quadro de medição em alta tensão, dim. 0.60x0,60x0.40m	un	2	1582,54	R\$	3.165,08	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2	DISJUNTORES				R\$	5.147,90			0,00%					0,00%
14.2.1	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	UN	27	10,91	R\$	294,57	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.2	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	UN	18	11,52	R\$	207,36	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.3	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	UN	14	12,69	R\$	177,66	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.4	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	UN	20	12,69	R\$	253,80	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.5	Disjuntos tripolare termomagnético 32A	UN	3	75,97	R\$	227,91	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.6	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	UN	2	111,21	R\$	222,42	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.7	Disjuntos unipolar termomagnético 160A	UN	2	735,02	R\$	1.470,04	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.8	Disjuntos bipolar termomagnético 100A	UN	1	183,10	R\$	183,10	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.9	Interruptor bipolar DR - 100A	un	2	234,69	R\$	469,38	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%

14.2.10	Interruptor bipolar DR - 25A	un	2	156,77	R\$	313,54	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.11	Interruptor bipolar DR - 63A	un	1	209,92	R\$	209,92	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.12	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	12	64,40	R\$	772,80	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.2.13	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	4	86,35	R\$	345,40	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			27.966,21	R\$			5.284,99	18,90%			8.203,11		29,33%		13.488,09	48,23%
14.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	368,20	10,37	R\$	3.818,23	184,10	1.809,12	50,00%		50	518,50	2,14	13,59%		2.427,62	63,58%
14.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	463,40	14,57	R\$	6.751,74	231,70	3.375,87	50,00%				231,70	0,00%		3.375,87	50,00%
14.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	12,80	17,11	R\$	219,01	-	-	0,00%	12,8		219,01	12,80	100,00%		219,01	100,00%
14.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	M	21,60	35,18	R\$	759,89	-	-	0,00%	21,6		759,89	21,60	100,00%		759,89	100,00%
14.3.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões	M	18,80	64,99	R\$	1.221,81	-	-	0,00%	18,8		1.221,81	18,80	100,00%		1.221,81	100,00%
14.3.6	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões	m	5,50	130,04	R\$	715,22	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.3.7	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões	m	27,20	188,83	R\$	5.136,18	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.3.8	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	M	45,70	48,68	R\$	2.224,68	-	-	0,00%	30		1.460,40	30,00	65,65%		1.460,40	65,65%
14.3.9	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	M	29,50	37,61	R\$	1.109,50	-	-	0,00%	20		752,20	20,00	67,80%		752,20	67,80%
14.3.10	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões	M	80,60	23,46	R\$	1.890,88	-	-	0,00%	20		460,20	20,00	24,81%		460,20	24,81%
14.3.11	Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões	M	14,70	280,21	R\$	4.119,09	-	-	0,00%	10		2.802,10	10,00	68,03%		2.802,10	68,03%
14.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			89.437,48	R\$				0,00%			1.188,00		1,30%		1.188,00	1,30%
14.4.1	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #2,5 mm²	M	5130,5	3,96	R\$	20.316,78	-	-	0,00%	300		1.188,00	300,00	5,85%		1.188,00	5,85%
14.4.2	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #4 mm²	M	506,6	6,12	R\$	3.100,39	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.4.3	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #6 mm²	M	4039,6	8,54	R\$	34.498,18	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.4.4	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #10 mm²	M	2530,5	9,94	R\$	25.153,17	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.4.5	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #16 mm²	M	186,9	14,21	R\$	2.655,85	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.4.6	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #25 mm²	M	52,1	21,82	R\$	1.136,82	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.4.7	Cabo flexível de cobre isolado unipolar, anti-chamas, 450/750V, #50 mm²	M	51,3	50,22	R\$	2.576,29	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.5	ELETROCALHAS			9.740,75	R\$				0,00%			4.871,34		50,01%		4.871,34	50,01%
14.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	un	0,7	112,92	R\$	79,04	-	-	0,00%	0,7		79,04	0,70	100,00%		79,04	100,00%
14.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,7	35,00	R\$	654,50	-	-	0,00%	14		490,00	14,00	74,87%		490,00	74,87%
14.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões	un	3,6	97,90	R\$	352,44	-	-	0,00%	3,6		352,44	3,60	100,00%		352,44	100,00%
14.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	un	6	112,39	R\$	674,34	-	-	0,00%	6		674,34	6,00	100,00%		674,34	100,00%
14.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	un	4,3	127,13	R\$	546,66	-	-	0,00%	4,3		546,66	4,30	100,00%		546,66	100,00%
14.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões	m	4,4	83,43	R\$	367,09	-	-	0,00%	4,4		367,09	4,40	100,00%		367,09	100,00%
14.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões	m	4,5	170,38	R\$	766,71	-	-	0,00%	4,5		766,71	4,50	100,00%		766,71	100,00%
14.5.8	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	un	35,3	55,66	R\$	1.964,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.5.9	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	un	6	75,30	R\$	451,80	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.5.10	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	un	1,3	29,37	R\$	38,18	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.5.11	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	2	69,35	R\$	138,70	-	-	0,00%	2		138,70	2,00	100,00%		138,70	100,00%
14.5.12	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3	69,35	R\$	208,05	-	-	0,00%	3		208,05	3,00	100,00%		208,05	100,00%
14.5.13	Suporte vertical eletrocalha 120x204mm	un	3	69,35	R\$	208,05	-	-	0,00%	3		208,05	3,00	100,00%		208,05	100,00%
14.5.14	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	3	69,35	R\$	208,05	-	-	0,00%	3		208,05	3,00	100,00%		208,05	100,00%
14.5.15	Suporte vertical eletrocalha 70x154mm	un	4	69,35	R\$	277,40	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.5.16	Suporte vertical eletrocalha 70x183mm	un	3	69,35	R\$	208,05	-	-	0,00%			-	-	0,00%		-	0,00%
14.5.17	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	2/0	69,35	R\$	1.387,00	-	-	0,00%	10		693,50	10,00	50,00%		693,50	50,00%

14.5.18	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	11	69,35	R\$ 762,85	-	-	0,00%	5	346,75	45,45%	5,00	346,75	45,45%
14.5.19	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	4	69,35	R\$ 277,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.5.20	Tala plana perfurada 50mm	un	28	5,08	R\$ 142,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.5.21	Tala plana perfurada 75mm	un	4	6,85	R\$ 27,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 45.924,34			0,00%			0,00%			0,00%
14.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UN	178	34,67	R\$ 6.171,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UN	18	36,93	R\$ 664,74	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.3	Interruptor simples 10 A, completa	UN	56	50,14	R\$ 2.807,84	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.4	Luminárias 2x36W completa	UN	111	159,12	R\$ 17.662,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.5	Luminárias 2x14 W completa	UN	17	116,96	R\$ 1.988,32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.6	Luminárias 2X36 com alaletas completa	UN	40	159,12	R\$ 6.364,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.7	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	15	471,29	R\$ 7.069,35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.8	Projeter com lâmpada de vapor metálico 150W	UN	4	384,23	R\$ 1.536,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.9	Projeter com lâmpada de vapor metálico 250W	UN	1	384,23	R\$ 384,23	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
14.6.10	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	16	79,66	R\$ 1.274,56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 795,00		R\$ 795,00	100,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 795,00	100,00%
15.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	120	4,77	R\$ 572,40	120,00	572,40	100,00%	-	-	0,00%	120,00	572,40	100,00%
15.2	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	UN	42	5,30	R\$ 222,60	42,00	222,60	100,00%	-	-	0,00%	42,00	222,60	100,00%
16	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 60.486,36		R\$ 932,00	1,54%		R\$ 4.192,27	6,93%		R\$ 5.124,27	8,47%
16.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				R\$ 18.012,69			0,00%			0,00%			0,00%
16.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2	1095,80	R\$ 2.191,60	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.2	Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6	un	2	3390,14	R\$ 6.780,28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.3	Switch de 24 portas	un	1	1289,69	R\$ 1.289,69	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.4	Switch de 48 portas	un	2	1267,86	R\$ 2.535,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.5	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	18	255,55	R\$ 4.599,90	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.7	Guias de cabos simples	un	2	22,96	R\$ 45,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.8	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1	22,96	R\$ 22,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.9	Guia de Cabos Vertical	un	2	22,96	R\$ 45,92	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.10	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1	22,96	R\$ 22,96	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.11	Perfil de montagem	un	1	35,50	R\$ 35,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.12	Anel organizador de cabos	un	2	8,13	R\$ 16,26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.13	Bandeja deslizante perfurada	un	2	178,79	R\$ 357,58	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.1.14	Kit pés niveladores	un	2	34,20	R\$ 68,40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				R\$ 18.677,35			0,00%			0,00%			0,00%
16.2.1	Cabo UTP Categoria 5e	m	144	3,71	R\$ 534,24	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.2	Cabo UTP-6 (24AWG)	m	3.191,30	4,01	R\$ 12.797,11	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.2.3	Cabo coaxial	M	450	11,88	R\$ 5.346,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.3	CABOS DE CONEXÃO				R\$ 3.727,00			0,00%			0,00%			0,00%
16.3.1	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	100	35,83	R\$ 3.583,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.3.2	Pluque 100 IDC - 4 pares	un	96	1,50	R\$ 144,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4	TOMADAS				R\$ 7.317,22			0,00%			0,00%			0,00%
16.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	72	70,25	R\$ 5.058,00	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.2	Placa 2x4" 1 modulo RJ45	un	24	12,78	R\$ 306,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.3	Placa 2x4" 2 modulo RJ45	un	24	12,78	R\$ 306,72	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.4	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	UN	16	19,05	R\$ 304,80	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.5	Placa 2x4" para TV/SAT	un	16	12,78	R\$ 204,48	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.4.6	Central PABX 50/300	un	1	1136,50	R\$ 1.136,50	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS				R\$ 1.917,88			0,00%			0,00%			0,00%
16.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	UN	4	266,11	R\$ 1.064,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.5.2	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	48	17,78	R\$ 853,44	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
16.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 10.834,22			8,60%		4.192,27	38,69%		5.124,27	47,30%
16.6.1	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	M	14,70	10,37	R\$ 152,44	14,70	152,44	100,00%	-	-	0,00%	14,70	152,44	100,00%
16.6.2	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	M	154,70	9,08	R\$ 1.404,68	77,35	702,34	50,00%	-	-	0,00%	77,35	702,34	50,00%

16:6.3	Eléctrodio PVC flexível 1 1/2" inclusive conexões	M	5,30	14,57	RS	77,22	5,30	77,22	100,00%	5,30	-	0,00%	5,30	77,22	100,00%
16:6.4	Eléctrodio Ferro Galvanizado Ø 1", fornecimento e instalação	M	5,80	48,68	RS	282,34	5,80	282,34	100,00%	5,80	-	0,00%	5,80	282,34	100,00%
16:6.5	Eléctrodio Ferro Galvanizado Ø 2 1/2", fornecimento e instalação	M	22,00	133,78	RS	2.943,16	22,00	2.943,16	100,00%	22,00	-	0,00%	22,00	2.943,16	100,00%
16:6.6	Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	UN	1,00	34,74	RS	34,74	1,00	34,74	100,00%	1,00	-	0,00%	1,00	34,74	100,00%
16:6.7	Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação	UN	6,00	176,01	RS	1.056,06	6,00	1.056,06	100,00%	6,00	-	0,00%	6,00	1.056,06	100,00%
16:6.8	Eléctrocilha lisa com tampa 100 x 100 mm inclusive conexões	m	5,40	112,92	RS	609,77	5,40	609,77	100,00%	5,40	-	0,00%	5,40	609,77	100,00%
16:6.9	Eléctrocilha lisa com tampa 100 x 50 mm inclusive conexões	m	10,20	357,00	RS	357,00	10,20	357,00	100,00%	10,20	-	0,00%	10,20	357,00	100,00%
16:6.10	Eléctrocilha lisa com tampa 50 x 50 mm inclusive conexões	m	65,50	55,66	RS	3.645,73	65,50	3.645,73	100,00%	65,50	-	0,00%	65,50	3.645,73	100,00%
16:6.11	Eléctrocilha lisa com tampa 75 x 50 mm inclusive conexões	m	3,60	75,30	RS	271,08	3,60	271,08	100,00%	3,60	-	0,00%	3,60	271,08	100,00%
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				RS	8.410,03		8.410,03	0,00%		-	0,00%			0,00%
17.1	Corifa em aço inox escovado AISI 304, tipo central, com filtros inertes, descarga vertical superior com diâmetro=30cm, Exaustor, duto, alt=600mm	un	1	8410,03	RS	8.410,03	1	8.410,03	0,00%		-	0,00%			0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				RS	50.885,66		50.885,66	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.1	Parafusos tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1,1/2" tipo simples	M	3	135,16	RS	405,48	3	405,48	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.2	Verghalão CA - 25 # 10 mm2	UN	42	10,81	RS	454,02	42	454,02	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.3	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	12	11,31	RS	135,72	12	135,72	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.4	Parafuso fenda em aço inox 4 2 x 32mm e bucha de nylon	M	24	0,53	RS	12,72	24	12,72	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.5	Presilha em latão	M	24	2,47	RS	59,28	24	59,28	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	UN	1	353,79	RS	353,79	1	353,79	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.7	Escavação de vala para aterramento		39	76,35	RS	2.977,65	39	2.977,65	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.8	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m.		12	41,10	RS	493,20	12	493,20	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.9	Cordalha de cobre nu 16 mm2		3	34,04	RS	170,20	3	170,20	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.10	Cordalha de cobre nu 35 mm2		330	64,82	RS	21.390,60	330	21.390,60	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.11	Cordalha de cobre nu 50 mm2		260	83,24	RS	21.642,40	260	21.642,40	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.12	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto		4	679,38	RS	2.717,52	4	2.717,52	0,00%		-	0,00%			0,00%
18.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²		12	6,09	RS	73,08	12	73,08	0,00%		-	0,00%			0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				RS	55.232,18		55.232,18	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	48,53	312,41	RS	15.161,26	48,53	15.161,26	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.2	Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M2	56,26	312,41	RS	17.576,19	56,26	17.576,19	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.3	Prateleiras e escaninhos em mdt	M2	48,02	144,93	RS	6.959,54	48,02	6.959,54	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.6	Bancos de concreto	M	7,22	183,62	RS	1.325,74	7,22	1.325,74	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.7	Banco e acabamento em granito	M2	3,62	312,41	RS	1.130,92	3,62	1.130,92	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.8	Pintoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M	106,8	86,90	RS	9.280,93	106,8	9.280,93	0,00%		-	0,00%			0,00%
19.9	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mX2" + 4mX1 1/2"))	UM	1	3797,61	RS	3.797,61	1	3.797,61	0,00%		-	0,00%			0,00%
20	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L				RS	49.789,64		49.789,64	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.1	Alça de içamento	KG	2	7,52	RS	15,04	2	15,04	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.2	Suporte de luz piloto	un	1	27,64	RS	27,64	1	27,64	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.3	Suporte para cinto de segurança	un	1	30,08	RS	30,08	1	30,08	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.4	Suporte para Para-raio	un	1	382,87	RS	382,87	1	382,87	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.5	Escada interna e externa tipo manilheto, inclusive pintura	M	8,4	67,12	RS	563,81	8,4	563,81	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.6	Guarda corpo de 1,2m de altura	M	6,97	440,48	RS	3.070,15	6,97	3.070,15	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e qualidade estrutural, com soldas interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.000,00	45,51	RS	45.510,00	1.000,00	45.510,00	0,00%		-	0,00%			0,00%
20.8	Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	un	1	190,26	RS	190,26	1	190,26	0,00%		-	0,00%			0,00%
21	SERVIÇOS FINAIS				RS	3.458,43		3.458,43	0,00%		-	0,00%			0,00%

21.1	Limpeza geral	m ²	1510,23	2,29	R\$	3.458,43	-	-	0,00%	-	-	0,00%
------	---------------	----------------	---------	------	-----	----------	---	---	-------	---	---	-------

SERVIÇOS			Contratado			Acumulado Anterior		Medição Atual		Acumulado Total		
Item	Discriminação detalhada	Und	Quant.	P.Unit.	Total	Valor	%	Valor	%	Quant.	Valor	%
	TOTAL GERAL				1.226.991,93	53.298,32	4,34%	70.720,80	5,76%		124.019,11	10,11%
	BDI - 20,42%		20,42%		250.551,75	10.883,52	4,34%	14.441,19	5,76%		25.324,70	10,11%
	TOTAL COM BDI				1.477.543,68	64.181,83	4,34%	85.161,98	5,76%		149.343,82	10,11%

Valor Total desta medição: OITENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

foram executados conforme projetos	Atesto que os serviços foram executados e aceitos	Medição aprovada para liberação
Responsável Técnico pela execução	Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira Engenheiro Civil - CREA- 191542110-1 Responsável Técnico Prefeitura de Caxias - MA	Prefeitura Municipal de Caxias - MA



Documento assinado digitalmente
RENAN MOISES DOS SANTOS COSTA
 Data: 17/02/2025 11:46:44 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Data: 20/02/2025 09:51:59 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	TIPO DE OBRA	Creche Proinfância 1		
	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Nº OBRA	CT Nº 001 da Concorrência Pública nº008/2023 (Proc. Adm. 00887/2023)/ Rua do Cajul, Luiza Queiroz, Caxias		
EMPRESA EXECUTORA:	ACCOR EMPREENDIMENTOS			Nº DA MEDIÇÃO	2
LOCAL:	Rua do Cajul, Luiza Queiroz, Caxias-MA			DATA DA VISTORIA	07/02/2025




Registro



Registro




Fachada

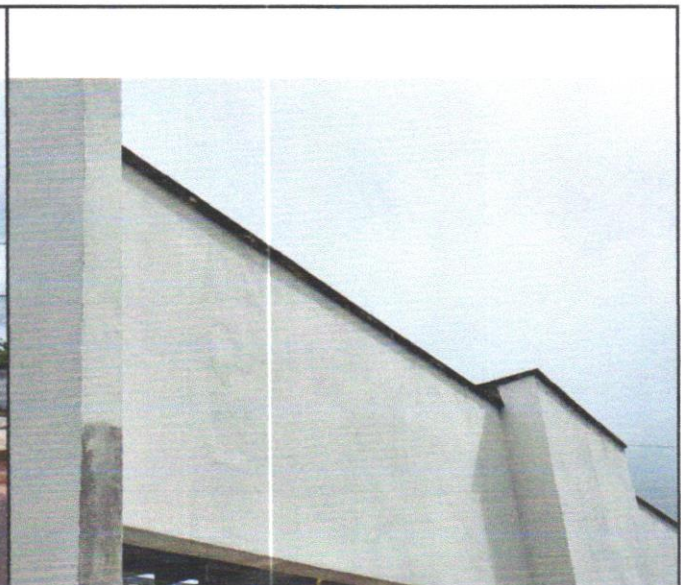


Pintura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	TIPO DE OBRA	Creche Proinfância 1		
	Secretaria Municipal de Infraestrutura	Nº OBRA	CT Nº 001 da Concorrência Pública nº008/2023 (Proc. Adm. 00887/2023)/ Rua do Cajú, Luiza Queiroz, Caxias		
EMPRESA EXECUTORA:	ACCOR EMPREENDIMENTOS			Nº DA MEDIÇÃO	2
LOCAL:	Rua do Cajú, Luiza Queiroz, Caxias-MA			DATA DA VISTORIA	07/02/2025

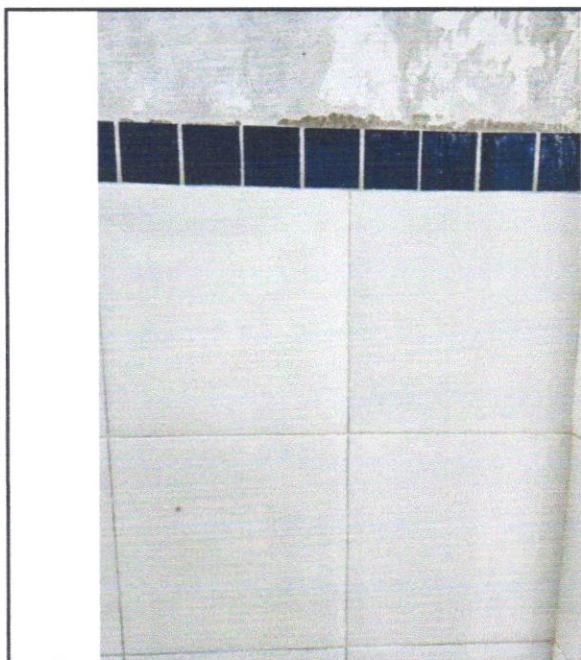

Revestimento

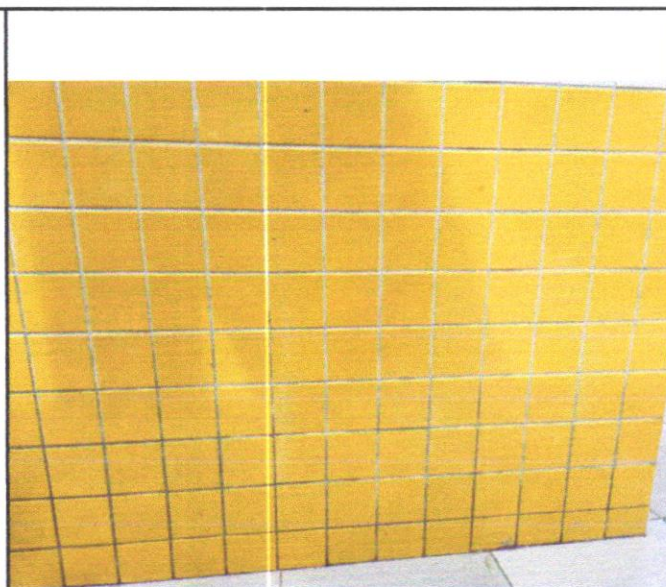


Revestimento



Telha



Revestimento


 Paulo Roman Cordeiro de Oliveira
 CREA / CONFEA 1915421101



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de R\$ 85.161,98 (OITENTA E CINCO MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), discriminada na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 202500000000003, referente a 2ª medição dos serviços CT Nº 001 da Concorrência Pública nº008/2023 (Proc. Adm. 00887/2023)/ Rua do Cajuí, Luíza Queiroz, Caxias, a execução dos serviços ocorreu dentro do prazo de execução definido do contrato.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Paulo Roman Cordeiro de Oliveira
CREA / CONFEA 1915421101
