



Ofício N° 298/2026

Caxias (MA), 25 de maio de 2026.

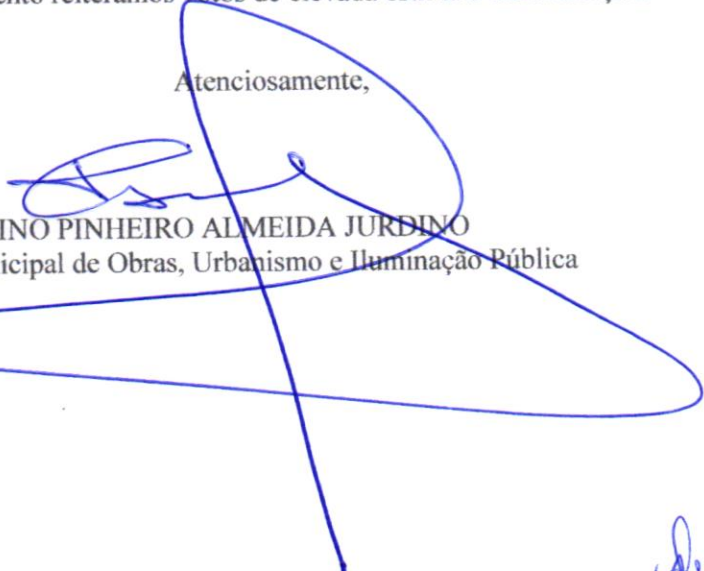
Á Sua Senhoria o Senhor  
**ADENILSON DIAS DE SOUSA**  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 2ª **Medição**, referente aos serviços do **CONTRATO 001, CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009/2025**, firmado com a empresa **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**, CNPJ - 10.797.251/0001-00, com sede na Rua São José, nº 1708, Bairro Fazendinha, Caxias-MA, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA, (**1ª MEDIÇÃO UIM JOSÉ GENTIL ROSA**) no valor de **R\$ 97.590,16 (Noventa e sete mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Informamos que a Fonte é do FUNDEB.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

*Recebido em  
26/05/26  
A Zap*



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO 001, CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009/2025**

Caxias (MA), 24 de novembro de 2025

**EMPRESA: CONSTRUTORA BELFORT LTDA –**

CNPJ:10.797.251/0001-00

ENDEREÇO: Rua São José, nº 1708, Bairro Fazendinha, Caxias-MA

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA.**

**VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (Doze) meses**

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 994.323,23 (Novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)**

**FONTE DE RECURSOS**

05 - Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia  
12.12.361.0009.2048.8000 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro -- Pessoa Jurídica;  
05 - Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia  
13.12.361.0009.1031.0000.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações  
05 - Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia  
07.12.361.0009.1013.0000 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações Conforme a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do referido Contrato.

Conforme Contrato de Execução de Serviços para **Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

**JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública



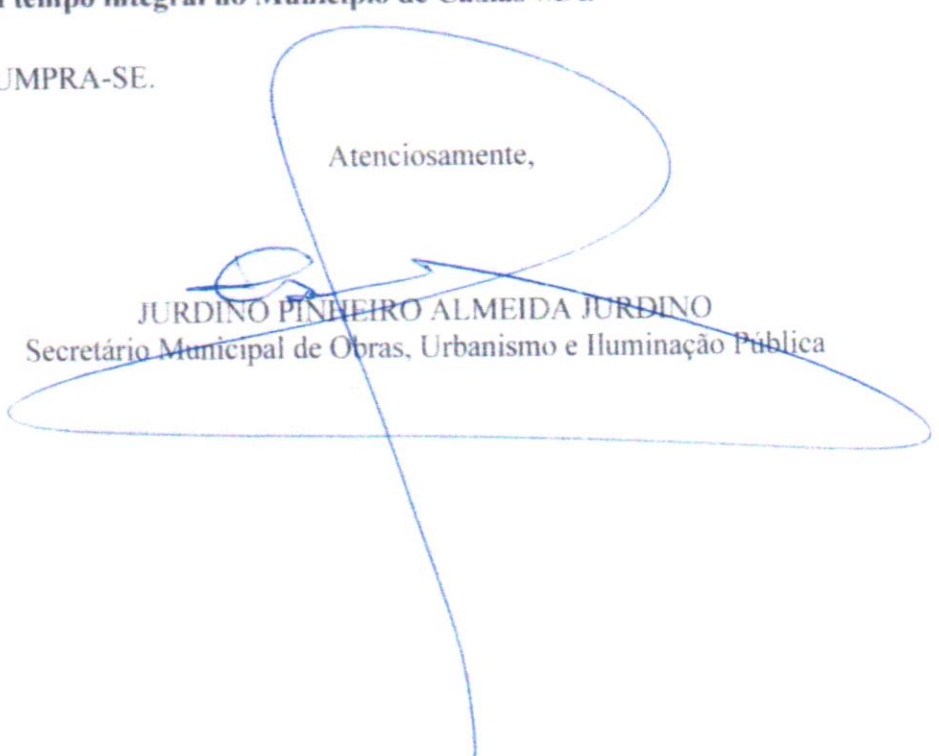
**PORTARIA 149 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:**

Art. 1º. Designar o Engenheira Civil, **LARISSA NARAH SILVA MACEDO, CREA-MA 1119950554**, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO 001, CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009/2025**, firmado com a EMPRESA: CONSTRUTORA BELFORT LTDA, CNPJ:10.797.251/0001-00, ENDEREÇO: Rua São José, nº 1708, Bairro Fazendinha, Caxias-MA cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,

  
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

## **OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO**

Senhor Secretario,

Vimos através deste, solicitar de v. senhoria a liberação de 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO NO 001 CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N:2009/2025 e (1º DA ESCOLA JOSE GENTIL ROSA).

Conforme a planilha em anexo.

Caxias/MA, 15 de Maio de 2026

CESAR  
AUGUSTO  
DE OLIVEIRA  
MOURA:215  
31919391

Assinado de  
forma digital  
por CESAR  
AUGUSTO DE  
OLIVEIRA  
MOURA:215319  
19391

---

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA  
CONSTRUTORA BELFORT LTDA  
Sócio - Administrador

# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

## **OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Senhor Secretário,

Vimos através deste, solicitar de v. senhoria a liberação do pagamento: 2º Medição do Contrato no 001 Concorrência 07/2025, processo administrativo n:2009/2025, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA(zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov.Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município De Caxias-MA.

**REFERENTE 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO NO 001 CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N:2009/2025 E ( 1º DA ESCOLA JOSE GENTIL ROSA).**

**Dados bancários:** Construtora Belfort Ltda Banco do Brasil Agencia 0124-4 Conta corrente: 42367-x

Caxias/MA, 21 de Maio de 2026

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391  
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391

---

**CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA**  
**CONSTRUTORA BELFORT LTDA**  
Sócio - Administrador

R SÃO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA



Chave de Acesso da NFS-e  
2103000221079725100010000000000001026050238268925



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 21/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/05/2026 11:40:33
Número da DPS 21	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 21/05/2026 11:40:33

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CONSTRUTORA BELFORT LTDA Endereço RUA SAO JOSE, 1608, FAZENDINHA Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	CNPJ / CPF / NIF 10.797.251/0001-00	Inscrição Municipal 31350 E-mail CESARMOURACX@GMAIL.COM Município Caxias - MA Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	Telefone (99) 8121-5496 CEP 65607-440
---	--	--	--

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXIAS Endereço DO PANTEON, 600, CENTRO	CNPJ / CPF / NIF 06.082.820/0001-56	Inscrição Municipal - E-mail - Município Caxias - MA	Telefone - CEP 65606-050
--	--	---	-----------------------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxias - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov.Trabalhosa - 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município De Caxias-MA. 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO NO 001 CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N:2009/2025 E ( 1º DA ESCOLA JOSE GENTIL ROSA)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caxias - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 97.590,16	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 97.590,16	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 3.903,61

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 97.590,16	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 3.903,61
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 93.686,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
Data 25/05/2026  
*(Assinatura)*  
Assinatura

**Larissa Narah Silva Macedo**  
Engenheira Civil  
CREA-MA nº 111995055-4

# CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.M JOSÉ GENTIL ROSA  
 PRAZO DOS SERVIÇOS: 16/02/2026 A 20/05/2026  
 LOCAL: CAXIAS / MA  
 MEDIÇÃO: 1ª

## PLANILHA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO -U.E.M. JOSÉ GENTIL ROSA					380.206,44		0,00		97.590,16	1,00		97.590,16	1,00
						73.932,92		0,00		14.902,82	0,15		14.902,82	0,15
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	230,00	128,29	160,36	36.882,80	0,00	0,00	40,00	6.414,40	0,07	40,00	6.414,40	0,07
1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350,00	46,42	58,02	20.307,00	0,00	0,00	60,00	3.481,20	0,04	60,00	3.481,20	0,04
1.1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	560,00	19,98	24,97	13.983,20	0,00	0,00	90,00	2.247,30	0,02	90,00	2.247,30	0,02
	SERVIÇOS													
1.1.4	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	519,55	649,43	649,43	0,00	0,00	1,00	649,43	0,01	1,00	649,43	0,01
1.1.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	m²	380,27	4,44	5,55	2.110,49	0,00	0,00	380,27	2.110,49	0,02	380,27	2.110,49	0,02
1.2	AMPLIAÇÃO					265.854,21		0,00		82.687,34	0,85		82.687,34	0,85
						20.355,16		0,00		20.355,17	0,02		20.355,17	0,02
1.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E INFRAESTRUTURA													
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	16,03	96,92	121,15	1.942,03	0,00	0,00	16,03	1.942,03	0,02	16,03	1.942,03	0,02
1.2.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,50	362,68	453,35	1.133,37	0,00	0,00	2,50	1.133,37	0,01	2,50	1.133,37	0,01
1.2.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,40	117,37	146,71	4.900,11	0,00	0,00	33,40	4.900,11	0,05	33,40	4.900,11	0,05
1.2.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	158,10	10,82	13,52	2.137,51	0,00	0,00	158,10	2.137,51	0,02	158,10	2.137,51	0,02
1.2.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	48,00	59,78	74,72	3.586,56	0,00	0,00	48,00	3.586,56	0,04	48,00	3.586,56	0,04
1.2.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,71	567,81	709,76	3.342,96	0,00	0,00	4,71	3.342,96	0,03	4,71	3.342,96	0,03
1.2.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃOASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	96,03	23,13	28,91	2.776,22	0,00	0,00	96,03	2.776,22	0,03	96,03	2.776,22	0,03
1.2.1.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	5,00	85,83	107,28	536,40	0,00	0,00	5,00	536,40	0,01	5,00	536,40	0,01
						70.900,84		0,00		54.673,55	0,56		54.673,55	0,56
1.2.2	SUPERESTRUTURA													
1.2.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	297,14	9,06	11,32	3.363,62	0,00	0,00	297,14	3.363,62	0,03	297,14	3.363,62	0,03
1.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	76,60	92,17	115,21	8.825,08	0,00	0,00	76,60	8.825,08	0,09	76,60	8.825,08	0,09

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

# CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA  
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.M JOSÉ GENTIL ROSA  
PRAZO DOS SERVIÇOS: 16/02/2026 A 20/05/2026  
LOCAL: CAXIAS / MA  
MEIÇÃO: 1ª

## PLANILHA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%
1.2.2.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,40	750,91	938,63	2.252,71	0,00	0,00		2,40	2.252,71	0,02	2,40	2.252,71	0,02
1.2.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	4,71	767,65	959,56	4.519,52	0,00	0,00		4,71	4.519,52	0,05	4,71	4.519,52	0,05
1.2.2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	335,80	77,48	96,85	32.522,23	0,00	0,00		335,80	32.522,23	0,33	335,80	32.522,23	0,33
1.2.2.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	671,66	3,80	4,75	3.190,38	0,00	0,00		671,66	3.190,39	0,03	671,66	3.190,39	0,03
1.2.2.7	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	671,66	19,33	24,16	16.227,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>27.747,89</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	197,50	63,19	78,98	15.598,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	209,32	39,94	49,92	10.449,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	57,30	23,74	29,67	1.700,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>17.790,37</b>		<b>0,00</b>			<b>7.658,62</b>	<b>0,08</b>		<b>7.658,62</b>	<b>0,08</b>
1.2.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	191,37	32,02	40,02	7.658,62	0,00	0,00		191,37	7.658,62	0,08	191,37	7.658,62	0,08
1.2.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	138,01	55,04	68,80	9.495,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3,20	55,97	69,96	223,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,12	105,85	132,31	412,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>12.362,74</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

# CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.M JOSÉ GENTIL ROSA  
 PRAZO DOS SERVIÇOS: 16/02/2026 A 20/05/2026  
 LOCAL: CAXIAS / MA  
 MEDIÇÃO: 1ª

## PLANILHA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA			
		UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%
1.2.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	763,21	954,01	2.862,03	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	868,21	1.085,26	1.085,26	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	819,17	1.023,96	1.023,96	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.5.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X80 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	11,36	520,53	650,66	7.391,49	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>15.165,95</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.1	Porto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	18,00	242,26	302,82	5.450,76	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.2	Porto de interruptor 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm	un	4,00	220,65	275,81	1.103,24	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.3	Porto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	16,00	185,05	231,31	3.700,96	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.4	Porto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	207,78	259,72	779,16	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.5	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	17,00	52,04	65,05	1.105,85	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.6	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	4,00	37,37	46,71	186,84	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	3,82	4,77	954,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	7,90	9,87	987,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.9	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	248,81	311,01	622,02	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.6.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	36,82	46,02	276,12	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>1.2.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>7.490,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.7.1	Retrada de louça sanitária	un	3,00	11,74	14,67	44,01	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

# CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.M JOSÉ GENTIL ROSA  
 PRAZO DOS SERVIÇOS: 16/02/2026 A 20/05/2026  
 LOCAL: CAXIAS / MA  
 MEIDÇÃO: 1ª

## PLANILHA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%
1.2.7.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	425,76	532,20	1.596,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.3	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	9,00	150,17	187,71	1.689,39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.4	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,65	361,36	451,70	745,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.5	Barreira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada	un	2,00	539,50	674,37	1.348,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.6	Chuveiro cromado	un	2,00	70,82	88,52	177,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.7	Ducha higienica cromada	un	2,00	125,56	156,95	313,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.8	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	15,40	19,25	38,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	396,79	495,98	991,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.10	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	54,46	68,07	544,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.8</b>	<b>COMBATE A INCENDIO</b>					<b>56.452,17</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>1.2.8.1</b>	<b>HIDRANTES</b>					<b>10.358,13</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.8.1.1	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	un	3,00	2.040,30	2.550,37	7.651,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.1.2	Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio	un	1,00	2.165,62	2.707,02	2.707,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.8.2</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES</b>					<b>19.972,73</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1.2.8.2.1	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=20mm (3/4")	M	1,00	28,64	35,80	35,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,78	58,39	72,98	129,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	103,80	71,47	89,33	9.272,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	93,71	117,13	117,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,00	126,26	157,82	2.367,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	44,87	56,08	112,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	79,65	99,56	199,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

# CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.M JOSÉ GENTIL ROSA  
 PRAZO DOS SERVIÇOS: 16/02/2026 A 20/05/2026  
 LOCAL: CAXIAS / MA  
 MEIDÇÃO: 1ª

## PLANILHA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR C/BDI	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%	QUANT	VALOR TOTAL	%
1.2.8.2.8	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	114,80	143,50	2.009,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.9	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	147,33	184,16	368,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.10	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	237,15	296,43	1.482,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.11	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	44,11	55,13	55,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	32,15	40,18	80,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	57,29	71,61	71,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.14	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,22	102,77	205,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.15	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	111,61	139,51	558,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.16	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	170,68	213,35	426,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.17	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	170,68	213,35	213,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.18	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	71,98	89,97	89,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.19	Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6")	un	3,00	23,51	29,38	88,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.20	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1"	un	3,00	26,10	32,62	97,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.21	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	1,00	22,58	28,22	28,22	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.2.22	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	un	2,00	95,57	119,46	238,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

  
**Larissa Narah Silva Macedo**  
 Engenheira Civil  
 CREA-MA nº 111395055-4

# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO**

**OBRA: Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA(zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov.Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município De Caxias-MA.**

**LOCALIZAÇÃO: ESCOLA JOSE GENTIL ROSA**

**MUNICIPIO: CAXIAS - MA**

Caxias/MA, 21 de Maio de 2026

# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



R SAO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA



# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



R SÃO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA



# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



R SÃO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA



# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



R SÃO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA



# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



R SÃO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA



# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



# CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



  
Larissa Narah Silva Macedo  
Engenheira Civil  
CREA-MA nº 111995055-4

# **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391  
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391

---

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA  
CONSTRUTORA BELFORT LTDA  
Sócio - Administrador

  
*Larissa Narah Silva Macedo*  
Engenheira Civil  
CREA-MA nº 111995055-4

R SÃO JOSE 1608 FAZENDINHA CEP: 65.607-440  
Caxias-MA





Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 97.590,16 (Noventa e sete mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centvos)**, conforme Nota Fiscal de Serviço N° 10 apresentada pela empresa **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**, CNPJ N° **10.797.251/0001-00**, referente à **1º Medição da reforma e ampliação da Escola UIM José Gentil Rosa (Zona Urbana)**, do Contrato N° 001, da Concorrência Eletrônica N° 07/2025, ao qual tem por objeto à **Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ ( Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA.**

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 25 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente  
**LARISSA NARAH SILVA MACEDO**  
Data: 25/05/2026 09:59:25-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

---

**Larissa Narah Silva Macedo**  
**Engenheira Civil**  
**CREA-MA 111995055-4**
